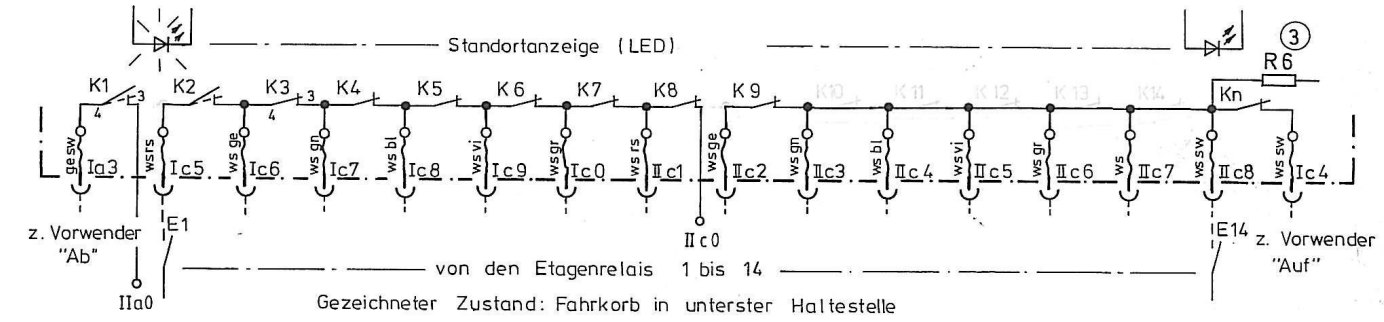





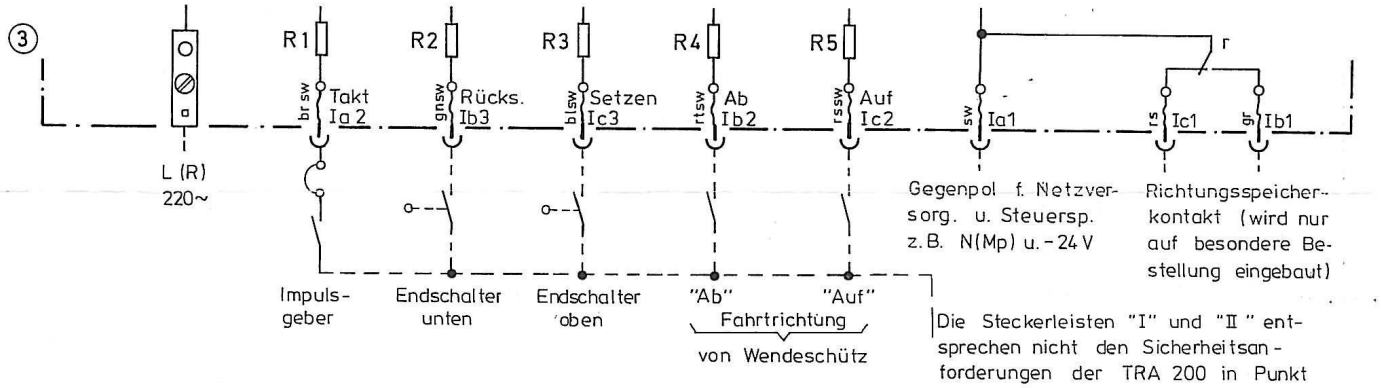

Die Steckerleisten "I" und "II" entsprechen nicht den Sicherheitsanforderungen der TRA 200 in Punkt 263.4 bzw. 264.12. Alle zur Sicherheitsschaltung führenden Anschlüsse sind daher an einem Punkt zusammenzufassen, um die Möglichkeit des Kurzschließens von Sicherheitskontakten auszuschließen.

In Grundausführung ist das Kopierwerk wie folgt ausgerüstet:

1. Netzversorgungs-Spannung an Klemme "L" und Steckk. Ia1: 220V AC
2. Anschlußspannung an den Widerständen "R1" bis "R6": 220 V AC/DC
3. Hilfsrelais "S" sind nicht eingebaut
4. Richtungsspeicherkontakt "r" ist nicht eingebaut

Abweichungen von der Grundausführung bitte in nachstehender Tabelle angeben:

②

Hilfsrelais S	verdrahtet als			
Kontaktreihe "a"	Schließer "s"		Öffner "ö"	
Kontaktreihe "b"	Schließer "s"			
Richtungsspeicher "r"				

③

Steuerspannung an R1... R5	Spannung an "Kette" R6
z. B. 24, 48, 60, 110 u. 220V AC/DC	

Belegung Steckerleiste I u. II



Bestell-Beispiel: KPW 4 s(a) 220

① ② ③

① Anzahl der Haltestellen

② mit Hilfsrelais, Kontakte werden wie folgt an die Steckerleisten I und II angeschlossen:

- "s(a)" 1 Schließer auf Kontaktreihe "a"
- "s(b)" 1 Schließer auf Kontaktreihe "b"
- "ss" je 1 Schließer auf Kontaktr. "a" u. "b"
- "sö" 1 Schließer auf Kontaktr. "b" u. 1 Öffner auf Kontaktreihe "a"
- "ö" 1 Öffner auf Kontaktreihe "a"

③ Steuerspannung u. Spannung an "Kette", ggfs. sind 2 Spannungen anzugeben.

Besteller:
Aufzugs- u.
Auftrags-Nr.:

REKOBA-Auftrags-Nr.:

22.07.97 Pl.
1.11.87 Pl.
20.6.83 Pl.
Bac

	bearb.	gepr.	norm.	Elektronisches Kopierwerk	Anschluß- und Bestell-Unterlage	REKOBA AS-KPW	Blatt:
Name							Blätter:
Datum							

VDR 27
